

HƯỜNG ĐÔNG

78 lá demo & hệ sinh thái Digital-first

Product bible • Website • Mini-game • Cốt truyện xuyên suốt
Sales funnel • KPI gates • RACI • Risk register

QUYẾT ĐỊNH CỐT LÕI

Đủ 78 lá ở cấp demo; chỉ 12 lá ở cấp trình diễn.

1. Kết luận điều hành

NÊN làm đủ 78 lá demo trước. KHÔNG nên hoàn thiện đủ 78 tranh in trước paid proof.

12 tuần	24 tuần	32 tuần	250 đơn
Khóa 78-card bible v1.0	Website + 3 game loops	Public proof & deposit	Print gate tối thiểu

Khuyến nghị này giữ nguyên tham vọng xây một thế giới 78 lá trọn vẹn, đồng thời bảo vệ đội khỏi nút thắt mỹ thuật và kỹ thuật. Tất cả 78 lá phải có cấu trúc, mapping RWS, câu chuyện, game tag và phác thảo low-fi nhất quán. Chỉ 12 hero cards được nâng lên chất lượng trình diễn để website, creator và khách hàng có đủ bằng chứng thẩm mỹ.

Ba nguyên tắc không thương lượng

- Demo là product bible có thể nghiệm thu, không phải tranh cuối cùng.
- Mỗi tính năng số phải nối với funnel: acquisition, retention hoặc deposit.
- Chỉ tiền thật mở khóa cam kết vốn: 30 deposit -> 100 deposit -> 250 đơn trả đủ + 120% cash coverage.

Phán quyết khách quan

Hướng 78 lá demo phù hợp với Hường Đông vì IP của dự án nằm ở tính hệ thống và câu chuyện xuyên suốt. Nó chỉ trở nên nguy hiểm khi đội đánh đồng demo với hoàn thiện mỹ thuật. Với giả định hiện tại, 78 final-art cards có thể chiếm 62-104 tuần của họa sĩ; khi đó website, game và sales learning đều bị chậm theo.

2. Definition of Done cho 78 lá demo

Một lá chỉ được đánh dấu Done khi đủ dữ liệu để bốn bộ phận cùng dùng: Tarot, narrative, art và product/tech. Visual demo được timebox; nếu vượt thời gian, giảm chi tiết thay vì kéo dài vô hạn.

#	Thành phần	Tiêu chí nghiệm thu
1	Danh tính	Số, tên Việt/Anh và vị trí trong hệ 78 lá được khóa.
2	Chức năng RWS	Ý nghĩa cốt lõi và vai trò trải bài không mâu thuẫn Rider-Waite-Smith.
3	Tích truyện	Một neo truyện Việt có nguồn hoặc ghi rõ mức độ sáng tác.
4	Cảnh và nhân vật	Mô tả một cảnh chính có thể minh họa, không chỉ là danh sách biểu tượng.
5	Năm biểu tượng	Mỗi biểu tượng có ý nghĩa Tarot và ý nghĩa văn hóa rõ ràng.
6	Từ khóa	Từ khóa xuôi/ngược và một câu diễn giải cho beginner.
7	Mạch truyện	Nêu liên kết với lá trước, lá sau và tuyến truyện tương ứng.
8	Game tag	Nhà, thuộc tính, lựa chọn hoặc phần thưởng dùng được trong game.
9	Web synopsis	Đoạn giới thiệu 80-120 từ và CTA liên quan.
10	Visual demo và quyền	Thumbnail/color script theo timebox; có ghi nguồn, quyền và trạng thái review.

Fidelity cap đề xuất: tối đa 3 giờ cho thumbnail + color script của mỗi lá. Sau 8 lá pilot, thay giả định bằng velocity thật.

12 hero cards

- 6 Major Arcana đại diện các bước ngoặt lớn của sử thi.
- Mỗi Nhà Minor Arcana chọn 1 Ace và 1 Court card, tổng 8 lá.
- Chọn 12 lá theo ba tiêu chí: dễ hiểu với beginner, giàu hình ảnh để chia sẻ, và có thể đại diện công năng Tarot.
- 66 lá còn lại chỉ public bằng silhouette, chi tiết cắt hoặc teaser low-fi để hạn chế lộ IP.

3. Kiến trúc cốt truyện và website

22 Major Arcana là xương sống; 56 Minor Arcana là bốn tuyến phụ. Mỗi tuyến phải vừa kể chuyện, vừa giữ ngữ pháp Tarot. Khi hai mục tiêu xung đột, chức năng RWS là guardrail bắt buộc.


Tuyến	Lá	Chủ đề	Công năng Tarot
Major Arcana	22	Nguồn gốc - lập quốc - thử thách - tái sinh	Trực sử thi và các chuyển hóa lớn
Wands / Tre / Thánh Gióng	14	Hành động, dũng khí, xung đột, trưởng thành	Ý chí, năng lượng, khởi sự
Swords / Dâu tằm / Liễu Hạnh	14	Phán đoán, trí tuệ, biến đổi, chủ quyền	Tư duy, sự thật, quyết định
Cups / Sen / Chữ Đồng Tử	14	Cảm xúc, quan hệ, chữa lành, hòa giải	Tình cảm, trực giác, kết nối
Pentacles / Lúa / Sơn Tinh	14	Đất, sinh kế, bền bỉ, quản trị	Vật chất, lao động, ổn định

Information architecture đề xuất

Route	Job-to-be-done
/	Định vị, 12 hero cards, CTA Chọn Nhà
/hanh-trinh	Bản đồ cốt truyện 22 chương và bốn Nhà
/cards/[slug]	Trang lá bài: lore, RWS, biểu tượng, teaser
/game/chon-nha	Game acquisition và share result
/quest/7-ngay	Retention, học thể giới, mở khóa nội dung
/spread/3-la	Utility, journal và CTA deposit
/journal	Lưu trải nghiệm, tăng repeat
/preorder	Deposit, tier giá, FAQ, minh bạch tiến độ

Nguyên tắc kỹ thuật: data model 78 lá phải là nguồn duy nhất cho website và game. Không hard-code nội dung riêng ở từng mini-game; nếu sửa nghĩa một lá, mọi bề mặt cập nhật đồng bộ.

4. Mô hình năng lực và nút thắt

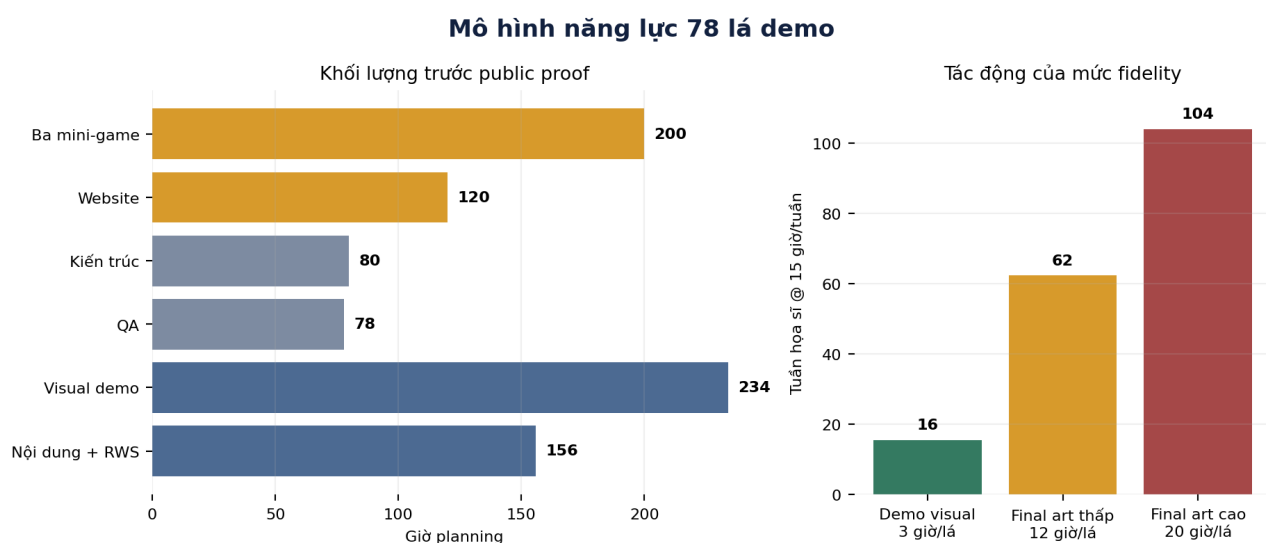

Cách đọc

Tổng planning trước public proof là 868 giờ. Ở năng lực 4 người x 12 giờ/tuần, khối lượng thuần tương đương 18,1 tuần; cộng 25% phối hợp, review và rework là khoảng 22,6 tuần. Roadmap kéo tới 32 tuần để dành thời gian alpha, public beta và sửa funnel - không phải toàn bộ 32 tuần đều là sản xuất.

Các giả định phải đo lại

- Content + RWS: 2 giờ/lá; visual demo: 3 giờ/lá; QA: 1 giờ/lá.
- Website MVP: 120 giờ; ba mini-game core: 200 giờ; không gồm AI/multiplayer.
- Nếu kỹ sư hoặc họa sĩ chỉ làm được ít hơn 12-15 giờ/tuần, ngày hoàn thành phải lùi hoặc scope phải giảm.
- Sau 8 lá pilot, dùng median giờ/lá và tỷ lệ rework để forecast lại; không tiếp tục dùng optimism.

Trigger đỏ: visual demo >3 giờ/lá, backlog >2 tuần hoặc một thành viên giữ độc quyền deploy/source files. Khi xảy ra, dùng nhận thêm scope.

5. Roadmap phần A - Khóa 78 lá và vertical slice

Từ tuần 1 đến tuần 16, mục tiêu là biến ý tưởng thành hệ thống 78 lá có thể nghiệm thu, sau đó chọn 12 lá đại diện để dựng trải nghiệm trình diễn.

Thời gian	Trọng tâm	Deliverable	Gate	Owner
Tuần 1-2	Khóa hệ thống	Template 78 lá, fidelity cap, source/IP log, RACI, 8 lá pilot	8/8 lá đạt DoD; đo giờ thật	Product + Creative + Tech
Tuần 3-6	22 Major Arcana	22 spec + thumbnail + story spine	Không có mâu thuẫn RWS blocking	Narrative/RWS + Art
Tuần 7-10	56 Minor Arcana	Bốn Nhà, mỗi Nhà 14 lá	Đủ 78 lá ở cấp demo	Bốn pod nội dung/visual
Tuần 11-12	Integration QA	78-card bible v1.0, source log, game tags	100% DoD; zero blocking contradiction	Product + QA văn hóa
Tuần 13-16	12 hero cards + foundation	12 high-fi cards; CMS/data schema; SSR/PWA; analytics	12/12 approved; tracking chạy	Art Director + Tech

Quyết định tuần 12

Nếu 78/78 lá chưa đạt DoD hoặc còn mâu thuẫn RWS blocking, không nâng thêm hero art và không mở rộng game. Website foundation vẫn có thể tiếp tục ở mức schema, auth, analytics và CMS, nhưng chưa public campaign.

6. Roadmap phần B - Sản phẩm số, public proof và pre-order

Từ tuần 17, mọi sprint phải chứng minh một mắt xích funnel. Public beta không phải lỡ ra mắt; đó là thí nghiệm thương mại có kill rule.

Thời gian	Trọng tâm	Deliverable	Gate	Owner
Tuần 17-20	Website MVP + Game 1	Story map, card pages, Chọn Nhà, waitlist	Funnel hoạt động end-to-end	Tech + Growth
Tuần 21-24	Game 2-3 + commerce	Quest 7 ngày, trải bài 3 lá, journal, referral, deposit	Payment và event QA 100%	Tech + Product + Growth
Tuần 25-28	Closed alpha	100-200 users, reader blind test, interviews	Sửa được top-3 friction	Growth + Reader panel
Tuần 29-32	Public beta	5-10 micro creators, traffic đủ điều kiện, deposit test	30 deposit proof; 100 deposit launch	Growth/Sales
Tháng 9-12	Pre-order và sản xuất	Nâng art có chọn lọc, prototype in, QC, fulfillment	250 đơn trả đủ + 120% cash coverage	CEO/Product + Production

Không đặt in vì 'đã đến tháng 12'. Chỉ đặt in khi 250 đơn trả đủ và tiền sẵn có bằng ít nhất 120% nghĩa vụ sản xuất - fulfillment.

7. Mini-game portfolio và funnel

Ba game đầu không cạnh tranh nhau; chúng phụ trách ba job khác nhau. Nếu một game không có KPI funnel riêng, nó chưa nên được xây.

#	Game	Vai trò funnel	KPI	Quyết định
1	Chọn Nhà Hường Đông	Acquisition + sharing	Start rate; completion; share	BUILD trước
2	Hành trình 7 ngày	Retention + learning	D1/D7; quest completion	BUILD sau Game 1
3	Trải bài kể chuyện 3 lá	Utility + conversion	Repeat; deposit conversion	BUILD sau content lock
4	Ghép biểu tượng	Engagement phụ	Session depth	BACKLOG
5	Leaderboard/multiplayer/AI	Không chứng minh nhu cầu mua	Chưa xác định	KHÔNG LÀM trước paid proof

Funnel vận hành

Bước	Cơ chế	Event đo
1. Acquire	5-10 micro creator + organic content	qualified_visit
2. Engage	Chọn Nhà 3-5 phút	game_start / complete / share
3. Retain	Quest 7 ngày và journal	quest_d1 / quest_d7
4. Prove utility	Trải bài kể chuyện 3 lá	spread_complete / repeat
5. Qualify	Waitlist + phân nhóm Beginner/Reader/Collector/Diaspora	waitlist_submit
6. Convert	Deposit 99k, trừ vào đơn hàng	deposit_paid
7. Close	Pre-order theo tier và print gate	order_paid

8. Sales motion và thang sản phẩm

Website và game là nhân viên bán hàng tự động: tạo tò mò, dạy thế giới, chứng minh công dụng và thu paid proof. Sản phẩm vật lý vẫn là đích đến; digital không được làm giảm ham muốn sở hữu.

Tier	Giá	Lời hứa	Vai trò
Free	0	Story map + Chọn Nhà + 12 hero cards	Acquisition
Founding Access	99k	Deposit, quyền sớm, badge, được trừ vào đơn	Paid proof
Early Bird	449k	Bộ bài sớm, giới hạn số lượng/thời gian	Tăng tốc
Standard	549k	Bộ bài chính thức	Neo doanh thu
Collector	649-799k	Bao bì/phụ kiện/nội dung giới hạn	Biên lợi nhuận
Founder	1,2-1,5M	Số hóa cá nhân, credit, trải nghiệm hậu trường	Superfan

Nhịp sales 4 tuần public beta

- Tuần 1: 2 creator pilot; test hai hook 'Tarot Việt' và 'hành trình sử thi'.
- Tuần 2: tối ưu completion/share; phỏng vấn cả người hoàn thành và bỏ dở.
- Tuần 3: mở deposit 99k; A/B test tier và bằng chứng tin cậy.
- Tuần 4: review deposit theo source; giữ top channel, dừng channel dưới kill rule.

Owner còn thiếu: một người chịu KPI creator pipeline, qualified visits và deposit conversion mỗi tuần.

9. KPI gates - chỉ bằng chứng mới mở khóa đầu tư

Các ngưỡng dưới đây là guardrail planning, không phải dự báo chắc chắn. Sau alpha, cần thay các ngưỡng hành vi bằng baseline thật; ba cổng tiền vẫn phải được giữ.

Cổng	Ngưỡng	Quyết định được phép
Content Gate	78/78 demo đạt DoD; 0 lỗi blocking	Cho phép nâng 12 hero cards
Product Gate	Website + 3 loops + tracking chạy end-to-end	Cho phép closed alpha
Alpha Gate	100-200 users; sửa top-3 friction	Cho phép public beta
Proof Gate	30 deposit ngoài mạng lưới thân quen	Cho phép tiếp tục acquisition có kiểm soát
Launch Gate	100 deposit	Cho phép mở pre-order lớn
Print Gate	250 đơn trả đủ + 120% cash coverage	Cho phép đặt in
Channel Kill Rule	<5 deposit / 1.000 qualified visits sau fair test	Dừng hoặc đổi channel/message

KPI hành vi tham chiếu cho alpha

Metric	Ngưỡng planning	Dùng để quyết định
Game start	>=25-30% qualified visits	Độ rõ CTA/hook
Quest completion	>=30-35% người bắt đầu	Giá trị cốt truyện/retention
Waitlist	>=25% người hoàn thành	Ý định, chưa phải paid proof
Deposit	Theo source và segment	North Star trước pre-order

10. RACI và governance

Tên người phụ trách được đề xuất theo biên bản và hồ sơ hiện có; cần xác nhận chính thức trong kick-off. Một người có thể giữ nhiều vai trò, nhưng mỗi workstream chỉ có một Accountable.

Workstream	Accountable	Responsible	Consulted
Product, gates, production	Nguyễn Hồng Khang	Product lead	Toàn đội
Narrative và biểu tượng	Nguyễn Thành Vinh	Narrative pod	Reader/cultural panel
RWS + kỹ thuật sản phẩm	Lê Đỗ Minh Thông	Tech + RWS pod	Product/Creative
Art direction và 12 hero cards	Nguyễn Ngọc Trúc Lam	Art pod	Narrative/RWS
Creator pipeline và deposit	Cần bổ nhiệm	Growth/Sales owner	CEO/Product

Bốn cơ chế chống single point of failure

- Repo, source art, design system, domain và deployment dùng quyền truy cập tổ chức.
- Card schema, event tracking plan và release checklist được ghi thành tài liệu.
- Ít nhất hai người có thể deploy/rollback; không chia sẻ key qua chat cá nhân.
- Review 45 phút mỗi tuần: velocity, rework, blockers, KPI funnel, quyết định stop/continue.

Lưu ý về kỹ sư Bách khoa

Lợi thế kỹ thuật lớn nhất không phải 'làm được nhiều tính năng', mà là xây một hệ dữ liệu duy nhất cho 78 lá và đo đúng funnel. Không nên giao đồng thời content RWS, frontend, backend, analytics, payment và vận hành cho cùng một người.

11. Risk register - các điểm có thể giết dự án sớm

Rủi ro	Mức	Trigger	Giảm thiểu	Owner
78 demo bị hiểu thành 78 final art	Rất cao	>3 giờ visual demo/lá hoặc backlog >2 tuần	Timebox, 12 hero cards, approval gate	Art Director + Product
Cốt truyện lẫn át công năng Tarot	Cao	Reader blind test không đọc được lá	RWS acceptance criteria và reader panel	RWS lead
Một kỹ sư thành nút thắt	Cao	Deploy, schema hoặc key chỉ một người giữ	Repo chung, documentation, backup access	CEO + Tech
Game có người chơi nhưng không có người mua	Cao	Completion tốt nhưng deposit thấp	CTA, paywall test, đo deposit theo source	Growth/Sales
Lộ IP trước khi bán	Trung bình-cao	Public toàn bộ art/source bible	Chỉ public 12 hero; 66 teaser/locked	Product
Phạm vi mini-game phình to	Cao	Thêm AI, multiplayer, leaderboard trước proof	Backlog freeze và kill rule	Product + Tech
Đội nhiệt tình nhưng không có owner sales	Cao	Không ai chịu KPI creator/deposit hàng tuần	Bổ nhiệm một Growth/Sales owner	CEO/Product

Rủi ro cấp 1 cần xử lý ngay: scope 78 final art, thiếu owner Sales và phụ thuộc một kỹ sư. Ba rủi ro này có thể làm tiến độ ngừng hẳn dù đội vẫn rất nhiệt tình.

12. Backlog điều hành 4 tuần đầu

Mục tiêu tháng đầu không phải 'vẽ được nhiều nhất' mà là đo được throughput thật và khóa hệ thống trước khi nhân 10 lần.

Mốc	Hành động	Đầu ra	Owner
48 giờ	Khóa template DoD, naming, versioning, source/IP log	Card schema v0.1	Product + Tech
Ngày 3-7	Làm 8 lá pilot: 4 Major + mỗi Nhà 1 lá	8 card specs + 8 thumbnails	Narrative/RWS + Art
Cuối tuần 1	Đo median giờ/lá, rework và blocker	Velocity baseline	Product
Tuần 2	Sửa template; khóa story spine 22 Major và bốn Nhà	Story map v0.5	Creative + RWS
Tuần 2	Tạo data model và prototype card page từ một nguồn dữ liệu	Schema + 1 page proof	Tech
Tuần 3	Sprint Major Arcana; QA theo batch 5-6 lá	10-12 Major Done	Content/Art pod
Tuần 4	Hoàn thành/khóa 22 Major; chọn shortlist hero cards	22 Major demo + shortlist	Product + Art Director
Cuối tuần 4	Reforecast toàn roadmap bằng actual velocity	Plan v1.1 và quyết định scope	CEO/Product

Tuyên bố kickoff nên dùng: 'Chúng ta hoàn thiện hệ thống 78 lá trước; chúng ta không hoàn thiện 78 tác phẩm in trước khi thị trường trả tiền.'

13. Độ tin cậy, giả định và nguồn

Overall assessment: Share with caveats

Roadmap đủ chắc để dùng làm kế hoạch điều hành ban đầu vì logic scope, capacity, funnel và gates được kiểm tra nhất quán. Tuy nhiên đây chưa phải forecast cam kết ngày giao hàng hay forecast doanh thu.

Khoảng trống cần đóng

- Chưa có traffic, CAC, conversion và deposit thật.
- Chưa có phỏng vấn khách hàng theo bốn segment ưu tiên.
- Chưa có velocity đo thật của họa sĩ, narrative/RWS và kỹ sư.
- Chưa có báo giá in, QC, đóng gói, fulfillment và nghĩa vụ tiến mặt đã khóa.
- RACI là đề xuất từ hồ sơ hiện có; cần từng thành viên xác nhận.

Spot-check tính toán

$78 \times 2 = 156$ giờ nội dung; $78 \times 3 = 234$ giờ visual demo; $78 \times 1 = 78$ giờ QA. Cộng kiến trúc 80, website 120 và game 200 = 868 giờ. $868 / 48 \times 1,25 = 22,6$ tuần. Final art: $78 \times 12-20 = 936-1.560$ giờ; ở 15 giờ/tuần = 62,4-104 tuần.

Nguồn hồ sơ

- Master Brief(1).docx.
- Ke_hoach_kinh_doanh_12_thang_Huong_Dong(1).docx.
- Bao_cao_tien_kha_thi_Huong_Dong_Tarot(1).docx.
- BBH_01(1).docx và BBH_2(1).docx.
- Nội dung The Empress(1).docx và Idea Ẩn chính.xlsx.
- Mô hình planning do Strategic Business Advisor lập ngày 30/07/2026; phải thay bằng actuals sau 8 lá pilot.

Quyết định cuối cùng: GO có điều kiện. Bắt đầu bằng 8 lá pilot trong tuần 1, khóa 78-card bible ở tuần 12 và bảo vệ ba cổng paid proof trước mọi cam kết sản xuất.
